



Avancement des travaux

Groupes Froids

L'installation des groupes froids au niveau du toit-terrasse situé au 7^e étage du Nouveau Bâtiment s'est terminée le **vendredi 13 octobre**. Cette installation a engendré des travaux dans les chambres de garde de réanimation et de neurologie qui sont en cours de réaménagement pour plus de confort. L'enceinte acoustique de ces groupes froids sera posée début janvier et la mise en service de ceux-ci effectuée le 9 février.



Tour Incendie

La phase 1 relative au grutage de cette nouvelle tour est désormais achevée.

La phase 2 qui concernera l'ouverture des façades pour la création des accès pompiers aux différents étages du bâtiment auquel l'escalier est raccordé débutera **en février 2024**.

Chiffres clés au 02/11/2023



46 mois de travaux



Horaires de chantier :
De 08h00 à 20h00
Du lundi au vendredi



15-20 personnes
(Effectif moyen)



Environ 4,5%
(Avancement au
02/11/2023)

Galerie des blocs opératoires

La destruction de la galerie des blocs a débuté fin août. Au niveau des blocs 16 et 17, le passage des gaines des blocs opératoires et la fermeture des plafonds sont finalisés.

Pour rappel :

- **Fermeture des blocs 16 et 17** jusqu'au 5 novembre, compensée par l'attribution des salles 12 et 14 pour l'activité de neurochirurgie.
- **Fermeture des blocs 1 et 6** du 6 novembre au 10 décembre, compensée par l'attribution des salles 12 et 14 pour l'activité d'ophtalmologie.

En parallèle, le local technique des blocs opératoires est en place au 3e étage de l'Ancien Bâtiment (anciennement bureaux des internes des services du Dr Galatoire et du Dr Caputo, des neuropédiatres et de la Médecine Physique et de Réadaptation).



Cour intérieure (Moreau)

Les travaux engagés fin juin pour le terrassement et le blindage se poursuivent par le coulage de la dalle et des parois de **la galerie technique** sous l'aile Moreau.

Le remblai au-dessus de la galerie technique a d'ores et déjà été réalisé. En fin de cette phase 0, débuteront les travaux de renforcement des fondations de l'Ancien Bâtiment et de fondation du futur bâtiment.

Département d'Ophtalmologie

Depuis la rentrée, l'**espace médical du 4eme** Ancien Bâtiment, dispose de :

- 15 postes de travail équipés
- un espace détente
- une salle de réunion
- vestiaires et douche
- casiers

Accessibles 24h/24, ces salles sont à destination des internes, assistants et séniors du Département d'Ophtalmologie.





Espace Niemeyer

Les travaux d'insonorisation de **la salle de convivialité** au 1er étage de l'Espace Niemeyer ont été réalisés le 26 octobre.

Une porte sépare désormais la salle du couloir, et le mur mitoyen entre la salle et le bureau adjacent a été équipé d'une solution anti-bruit.

Cet espace se réserve via le calendrier des salles sur Outlook : **Salle de convivialité 2PCF**.

Travaux à venir

Suppressions des passerelles

A compter du **lundi 8 janvier**, les passerelles reliant l'Ancien au Nouveau Bâtiment seront définitivement fermées.

Aussi, pour accéder aux ascenseurs verts et aux services d'Hospitalisation, Imagerie, HDJ, Consultations D-E-F-G et Rétrocession :

➡ Accès fléché par les sous-sols pour les personnels uniquement.

➡ Accès fléché par l'extérieur du bâtiment, vers les entrées des urgences, au 25 rue Manin.

Pour accéder aux vestiaires des blocs opératoires :

➡ Ascenseur ou escalier jaunes.

Accès avec badge après 18h30 et le week-end.

➡ Accès aux lignes rouge, bleu et jaune : pas de changements sauf après 18h30 et le week-end, entrée par le 27 rue Manin.

➡ Le BRVO et le CEPO deviennent respectivement les points A et B de la ligne jaune.



Des visites d'explication de ces nouveaux circuits vous sont proposées :

- mercredi 3 janvier de 12h à 14h
- jeudi 4 janvier de 19h30 à 22h
- Vendredi 5 janvier de 12h à 14h

[Réservez votre créneau de visite en ligne.](#)



Groupe Electrogène

Le Groupe Electrogène a été installé mi-octobre dans l'enceinte prévue à cet effet. Celle-ci sera fermée par un toit plat et le mur habillé d'une fresque. **Le Groupe électrogène sera mis en service fin novembre.**

Des essais mensuels d'1h seront réalisés tôt le matin; un Everyone informant des dates des essais sera systématiquement envoyé.

Consultations d'ophtalmologie

Du mardi 31 octobre au samedi 25 novembre, des interventions de nuit (20h-7h30) ont lieu au niveau des consultations d'ophtalmologie au 1er étage de l'Ancien Bâtiment.

Il s'agit de **passages de câbles et dévoiements de gaines dans les faux plafonds**.

Il est conseillé aux équipes du bloc d'accéder aux vestiaires par l'escalier de la passerelle, pendant ces horaires de travaux.



Galerie des blocs

La destruction de la galerie des blocs se déroule en 3 phases :

- Isolation de la galerie des blocs (**en cours**)
- Démarrage du curage (réseaux, etc...), **à partir du 15 janvier**.
- Démolition de la galerie depuis la cour intérieure (dans le sens Mathurin Moreau vers Manin), **du 26 avril au 13 juin**. Ces travaux pourront être ajustés en fonction des nuisances vibratoires et sonores générées.


Centrale des fluides médicaux

Au niveau de la cour des Urgences (Manin) sont réalisés les travaux de maçonnerie de l'emprise qui accueillera **la centrale des fluides médicaux**, actuellement située au niveau de la zone logistique, avenue Mathurin Moreau. La mise en service des fluides médicaux est programmée pour mars 2024.

Durant ces travaux, le brancardage est possible 100% du temps. Les SMUR et ambulances peuvent stationner entre le portail et la zone de travaux.



PLANNING CHANTIER

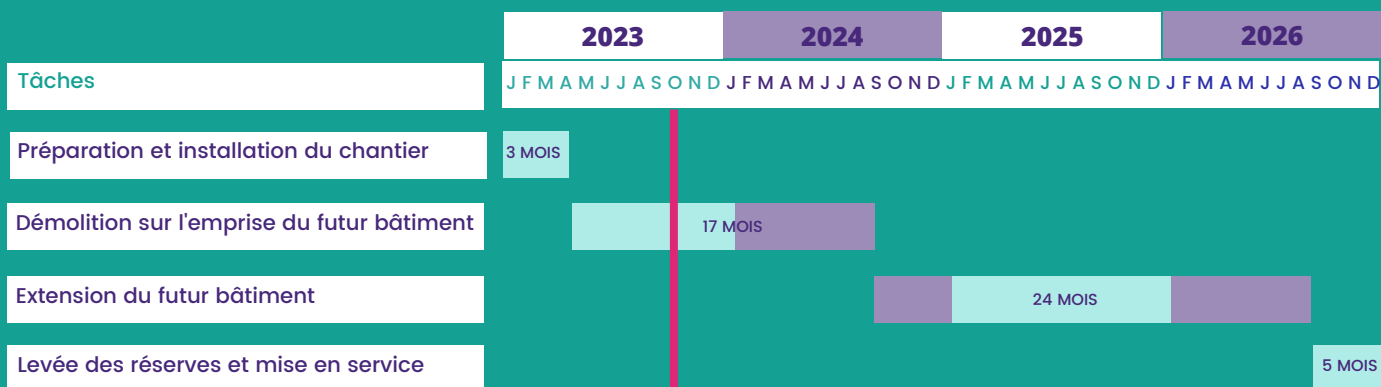

Avancement au 02/11/2023
Environ 4,5 %

Déménagements

A ce jour, et dans le cadre du projet HÔPITAL 2030, **33 déménagements** ont été effectués.

Ils ont concerné 417 personnes :

- 263 Personnels Médicaux
- 48 Personnels non Médicaux
- 106 Administratifs



Concernant entre autres :

- 153 personnes à l'Espace Niemeyer
- 86 personnes à l'Institut Noémie de Rothschild
- 14 personnes au 47bis Mathurin Moreau
- 17 personnes au 33 rue Manin

Suite à ces mouvements, plus de 140 actions d'amélioration et de suivi ont été engagées.

Et parmi celles-ci :

- Aménagement de l'espace du 4ème AB destiné aux ophtalmologistes
- Travaux du 7ème étage du 5 PCF
- Livraison de repas du self proposée aux salariés des sites externes : 5PCF, Niemeyer, Secrétan et INR
- Elaboration d'un guide d'utilisation et de réservation des salles de réunion

Derniers « grands mouvements » avant les travaux d'extension :

Décembre 2023 : Centralisation des activités de Recherche à l'Espace Niemeyer à la suite de l'optimisation de l'occupation des espaces.

Janvier 2024 : Déménagement des consultations de neurologie et du Centre de Référence Maladies Rares, maladie de Wilson sur le nouveau site, au 33 rue Bourret.

Août 2024 : Mise en service du bâtiment provisoire (activités tertiaires & accueil du bloc ambulatoire) et regroupement des consultations de Neurochirurgie adultes & pédiatriques et CETD en zone verte.

Merci à toutes les équipes pour leur investissement et leur adaptabilité.



Médecine hospitalière

Depuis le 19 octobre et en préparation de l'emprise chantier liée à la suppression des passerelles, les consultations de Médecine Hospitalière ont déménagé au 3ème Ancien Bâtiment. L'accès s'y fait depuis l'ascenseur bleu et le parcours est ensuite fléché et accompagné de pastilles-signalétique au sol.

Se trouve également au même étage, depuis cet été, l'EEG vidéo adulte.

Équipe projet HÔPITAL 2030

Venez rencontrer l'équipe projet le **jeudi 9 novembre** de 11h30 à 14h, autour d'un café, à la sortie du self.



Voir la composition de l'équipe projet : [Page 10 de la Newsletter d'e l'Hôpital](#) (Numéro d'octobre)
